

「後期実施計画」の変更について

「第4次総合計画 後期実施計画」（対象期間：令和3年度～7年度）を一部変更します。

- (1) 子ども医療費助成事業【拡充】
- (2) 府中南公民館改築事業【延伸】
- (3) 学校施設整備事業【新規】

令和5年度以降、住民の生活に大きな影響が生じる上記の3事業について、変更を予定していることから、以下のとおり「後期実施計画」を変更するものです。

単位施策 131 子育て世代への重点支援

■ 計画事業6 子ども医療費助成事業（子育て支援課、保険年金課）

拡充事業

事業指標		目標値		
		R5	R6	R7
受給者数 (人)	変更前	5,729	5,729	5,729
	変更後	6,923	6,923	6,923
具体的な取り組み	変更前	●乳幼児及び小学生の通院及び入院並びに中学生の入院に係る医療費の一部又は全部を助成し、保護者の経済的負担を軽減します。		
	変更後	●乳幼児及び小学生の通院及び入院並びに中学生の入院に係る医療費の一部又は全部を助成し、保護者の経済的負担を軽減します。令和6年1月診療分以降は、中学生の通院まで対象の拡充を図ります。		

単位施策 231 教育施設・設備の充実

■ 計画事業2 府中南公民館改築事業（社会教育課）

事業指標		目標値		
		R5	R6	R7
事業進捗率（％）	変更前	1.7	5.5	40.0
	変更後	-	1.7	5.5
具体的な取り組み	変更前	●開館後60年を迎え老朽化した府中南公民館について、基本設計・実施設計等を経て改築工事に着手します。（令和4年度～）		
	変更後	●開館後60年を迎え老朽化した府中南公民館について、基本設計・実施設計等を経て改築工事に着手します。ただし、新たに検討すべき課題が生じたことから、令和5年度以降、事業を1年延伸します。		

■ 計画事業5 学校施設整備事業（教育総務課）

新規事業

事業指標		目標値		
		R5	R6	R7
事業進捗率（％）		100	-	-
具体的な取り組み		●府中中央小学校の校舎を増築し、教室数の不足を解消します。（令和5年度）		

子ども医療費助成制度の拡充について

1. 概要

府中町に住所のある子どもが医療機関等（病院や保険薬局など）で保険診療を受ける際、医療費（保険診療の自己負担分）の一部または全部を助成します。

2. 改正内容

令和6年1月診療分から、通院にかかる子ども医療費助成制度の対象を「小学6年生」から「中学3年生」まで拡充します。

これにより、中学3年生までは、「入院」「通院」ともに対象範囲となります。

3. 助成内容

自己負担額（医療機関ごとに1日につき500円を、入院及び通院それぞれ月4日までを限度とする。）を超えた部分を助成します。（所得制限あり、非課税世帯は自己負担なし）

◆子ども医療費助成◆

改正前(令和5年12月診療分まで)		
区分	未就学児・小学生	中学生
入院	医療機関ごとに1日500円を入院・通院それぞれ月4日まで自己負担あり(5日目以降自己負担なし) ※非課税世帯は自己負担なし	<u>入院のみ</u> 医療機関ごとに1日500円を月4日まで自己負担あり(5日目以降自己負担なし) ※非課税世帯は自己負担なし
通院(外来)		
薬剤	自己負担なし(医師の処方箋によるものに限る)	※非課税世帯は自己負担なし



改正後(令和6年1月診療分から)	
区分	未就学児・小学生・中学生
入院	医療機関ごとに1日500円を入院・通院それぞれ月4日まで自己負担あり(5日目以降自己負担なし) ※非課税世帯は自己負担なし
通院(外来)	
薬剤	自己負担なし(医師の処方箋によるものに限る)

4. 今後のスケジュール

令和5年3月上旬	条例改正、令和5年度予算計上（3月定例議会）
4月上旬～10月下旬	システム改修
5月	広報（制度の説明）
10月	広報（申請の案内）
11月上旬	申請勧奨通知発送
12月上旬～	受給者証の発送
令和6年1月～	実施（1月診療分から）

5. 受給者数

(単位:人)

	未就学児	小学生	中学生	合 計
R元年度実績	3,293	2,430	6	5,729
R2年度実績	3,264	2,454	6	5,724
R3年度実績	3,167	2,424	5	5,596
R4年度推計	3,148	2,477	5	5,630
R5年度推計	3,094	2,519	1,310	6,923

※受給者数の推計は、「府中町行政区別年齢別人口統計」(R5、R4)を基に算出。

※中学生は、児童手当特例給付対象者を考慮して算出。ただし、R元年度からR4年度までは、「入院のみ」の人数。

6. 制度改正に伴う必要経費

(1) 扶助費

医療給付費の状況(医療費は3~2月診療分、現物給付は4~3月決定分) (単位:円)

	未就学児	小学生	中学生	合 計
R元年度実績	72,677,899	55,837,447		128,515,346
R2年度実績	53,824,683	49,052,924		102,877,607
R3年度実績	67,227,748	56,006,373		123,234,121
R4年度推計	71,311,487	60,610,563		131,922,050
R5年度推計	70,455,749	62,246,899	9,456,150	142,158,798

◎R4年度とR5年度の推計については、R4.11月給付実績(最新)の伸び率で算出。

◎小学生は、R元年度からR4年度までは中学生の入院を含む。

◎中学生のR5年度推計は、R6年1月から3月の3か月で算出。

(※年間見込みは34,386,000円)

(2) 委託料

システム改修委託料 4,608,000円

(3) その他

郵送料、審査手数料等

府中南公民館改築に係る再検討について

1. これまでの経緯

昭和 37 年に建築された府中南公民館は、建築後 60 年が経過し老朽化が進むとともに、新耐震基準前の建築物であることから、耐震性についても課題となっていました。

町では、平成 30 年度に現在地で改築する方向で事業検討を行い、令和 2 年度に策定した「第 4 次総合計画 後期実施計画」（対象期間：令和 3 年度～7 年度）において、当該事業検討の内容を反映させ、事業費を計上しました。

「後期実施計画」におけるスケジュールは、次表のとおりです。

● 府中南公民館改築スケジュール

年 度	事業内容
令和 4 年度	耐震診断
令和 5 年度	基本設計
令和 6 年度	実施設計
令和 7 年度	改築工事着手
令和 8 年度	改築工事完了
令和 9 年度	リニューアルオープン

なお、耐震診断は既に終わっており、耐震性が不足していることを確認しています。

2. 再検討の必要性

「後期実施計画」の策定以降、府中南公民館周辺において新たに検討すべき課題が次のとおり生じました。

(1) 浸水想定区域の指定

広島県では、平成 27 年の水防法改正を受け、想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域を指定・公表しています。令和 2 年 3 月に太田川水系太田川洪水浸水想定区域（想定最大規模）の指定があり、現在の府中南公民館の敷地が「浸水深 1.0～3.0m」の区域となりました。

※3.0m…概ね 1 階部分が浸水する想定

- ・平成 30 年度の事業検討では、現在の府中南公民館と同様、1 階部分に講座室やホール入口を配置する建物を想定していましたが、浸水時には使用不可の状態となります。
- ・浸水対策として、現在の府中公民館のように 1 階部分をピロティ駐車場とする必要がありますが、日影規制により建物の高さの制限（10m）を受けるため、講座室等の面積は縮小することとなります。

※府中公民館の敷地…「浸水深 1.0～3.0m」の区域に指定




図：洪水ポータルひろしま 浸水想定（洪水・想定最大） 府中南公民館周辺

(2) 周辺道路の想定交通量の変化

令和4年度末に東広島・安芸バイパス及び広島南道路明神高架橋が開通するため、広域的な交通量の変化が予想されています。このため、広島市東部地区連続立体交差事業推進協議会 道路整備部会では、交通量推計を実施し、令和4年7月に報告があったところですが、連立事業（Ⅰ期・Ⅱ期）完成時において、広島海田線（青崎南以西）の混雑度が現況よりも増加する見通しが示されました。

- ・府中南公民館前面道路は、交差点の中心部が敷地への進入路となる変則的な形態で、かつ信号がありません。
- ・都市計画道路青崎池尻線が全線開通した場合、広島海田線の渋滞を回避するための流入交通が発生し、府中南公民館前面道路の交通量の増加が見込まれます。
- ・府中町域に係る広島市東部地区連続立体交差事業の完成後（Ⅰ期：令和12年度予定）、交通量の増加が見込まれます。
- ・以上のことから、車両においても徒歩においても、府中南公民館への来館の動線に支障が生じるものと想定されます。

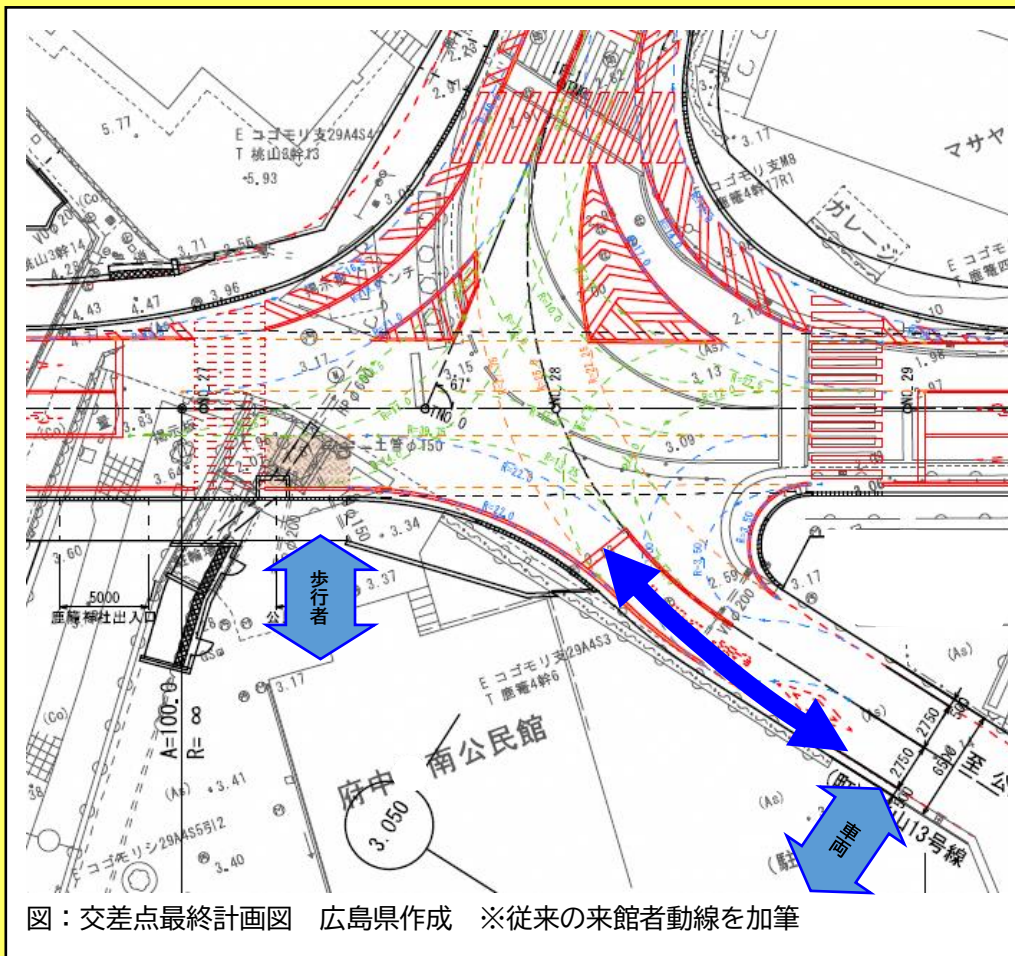

3. 今後について

府中南公民館は、府中町南部地区の生涯学習の拠点であることから、その改築については、活動者や周辺住民が高い関心を持っています。

より活動しやすい、より質の高い府中南公民館とするために、「後期実施計画」のスケジュールを「1年延伸」し、現位置での建替えが適切であるかどうかを含め、再検討を行うこととします。

● 府中南公民館改築スケジュール

年 度	事業内容	
	変更前	変更後
令和5年度	基本設計	再検討 ※
令和6年度	実施設計	基本設計
令和7年度	改築工事着手	実施設計
令和8年度	改築工事完了	改築工事着手
令和9年度	リニューアルオープン	改築工事完了
令和10年度		リニューアルオープン

※ 「再検討」スケジュール


令和5年度上期： 利用者への利用状況調査等の実施
規模・候補地等の検討
令和5年度下期： 事業費・財源の検討
議会説明（全員協議会）

兒童推計

[illegible]



- ※1 令和5年2月1日時点の児童・学級数
- ※2 令和5年2月1日時点の令和5年4月1日の児童・学級数見込み
- ※3 令和6年以降は、後期実施計画作成時に示された人口フレームを令和4年4月1日の実績に修正した児童・学級数見込み

令和4年度 教室 28教室（普通教室 24教室＋特別支援学級 4教室）

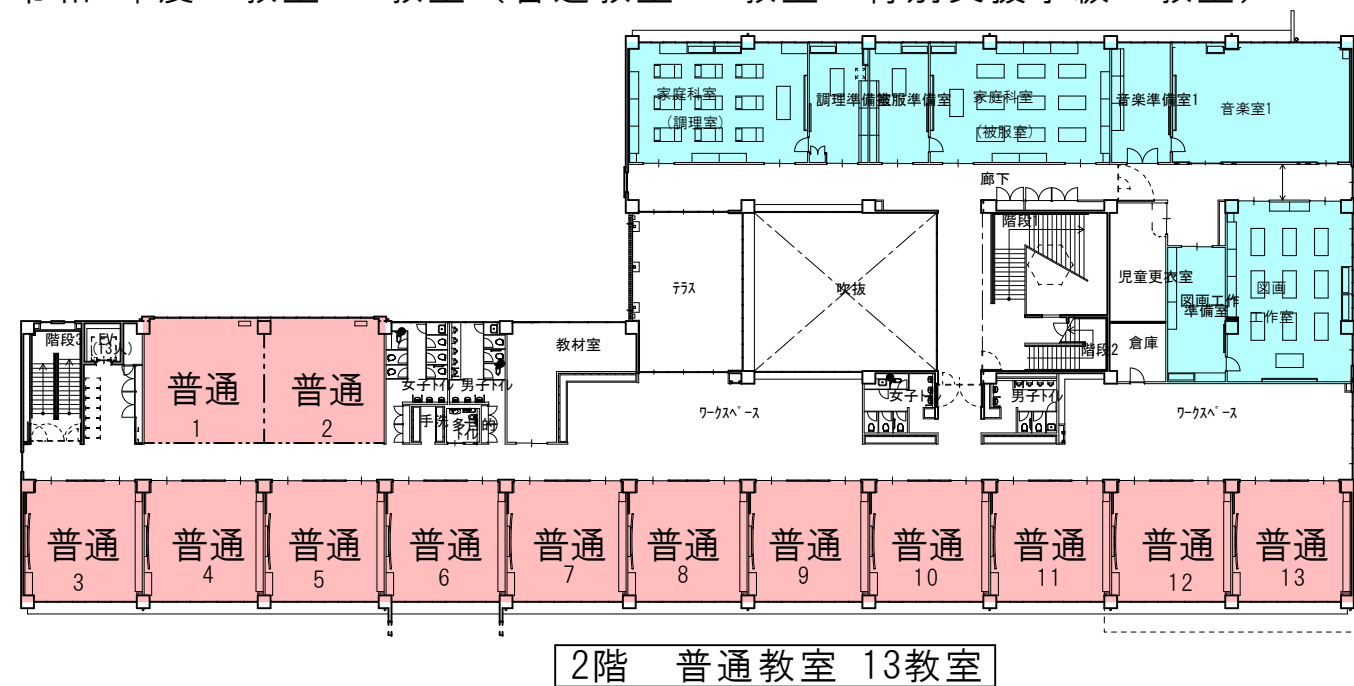

凡例

- 普通教室：普通
- 特別支援学級：特支
- 特別教室
- 通級指導教室等
- 放課後児童クラブ

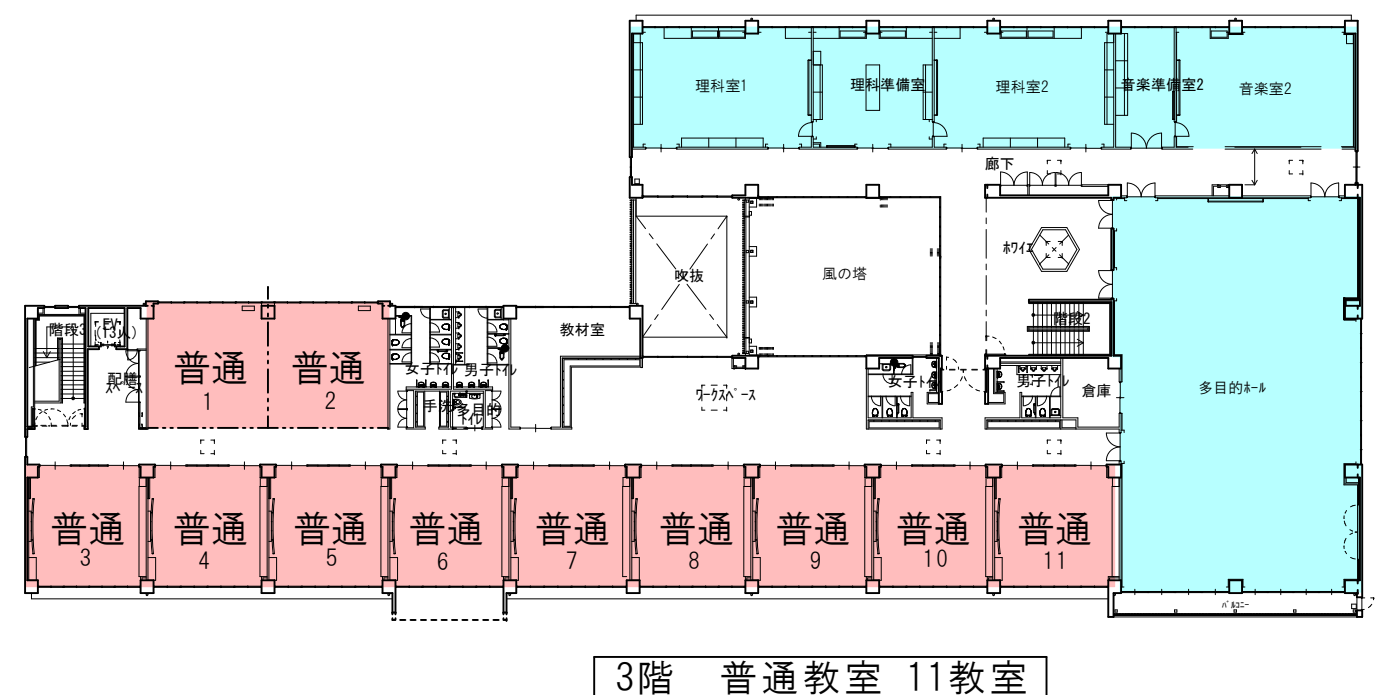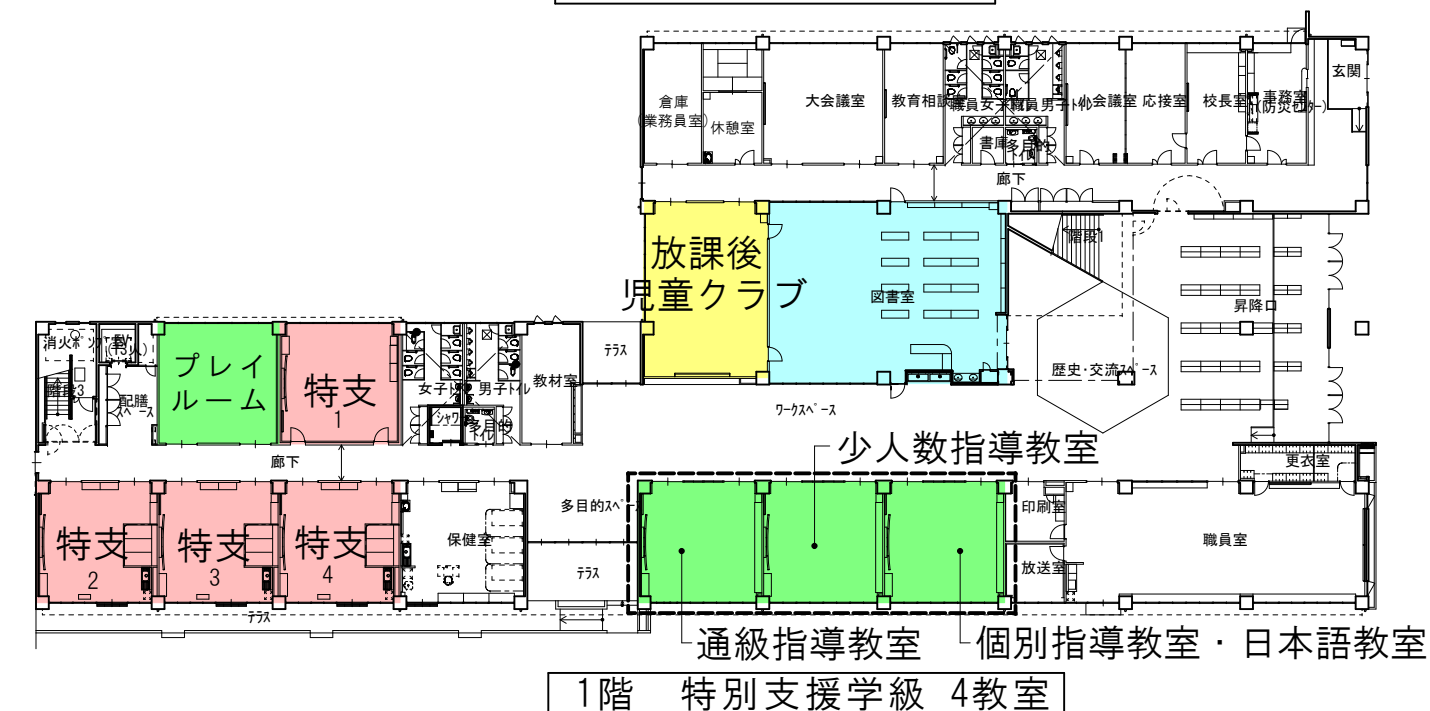

府中中央小学校増築工事について

◎建築予定地

府中町浜田二丁目6-1

探求の森の東側のあたりで、極力南側に建設

◎建物

- (1) 構造：軽量鉄骨造
(2) 階 層：平屋建て
(3) 規 模：普通教室 2 教室＋放課後児童クラブ
(4) そ の 他：渡り廊下（既存校舎との接続）

◎ 工期

議会の議決後、契約の翌日から令和6年3月31日

◎事業費


186,604,000円

◎財源内訳

公立学校施設施設費国庫負担金を活用
子ども・子育て支援施設整備交付金を活用

国庫負担金	21,047,000円
国庫補助金	19,373,000円
県補助金	19,373,000円
起債	100,400,000円
一般財源	26,411,000円

合計	186,604,000円
----	--------------

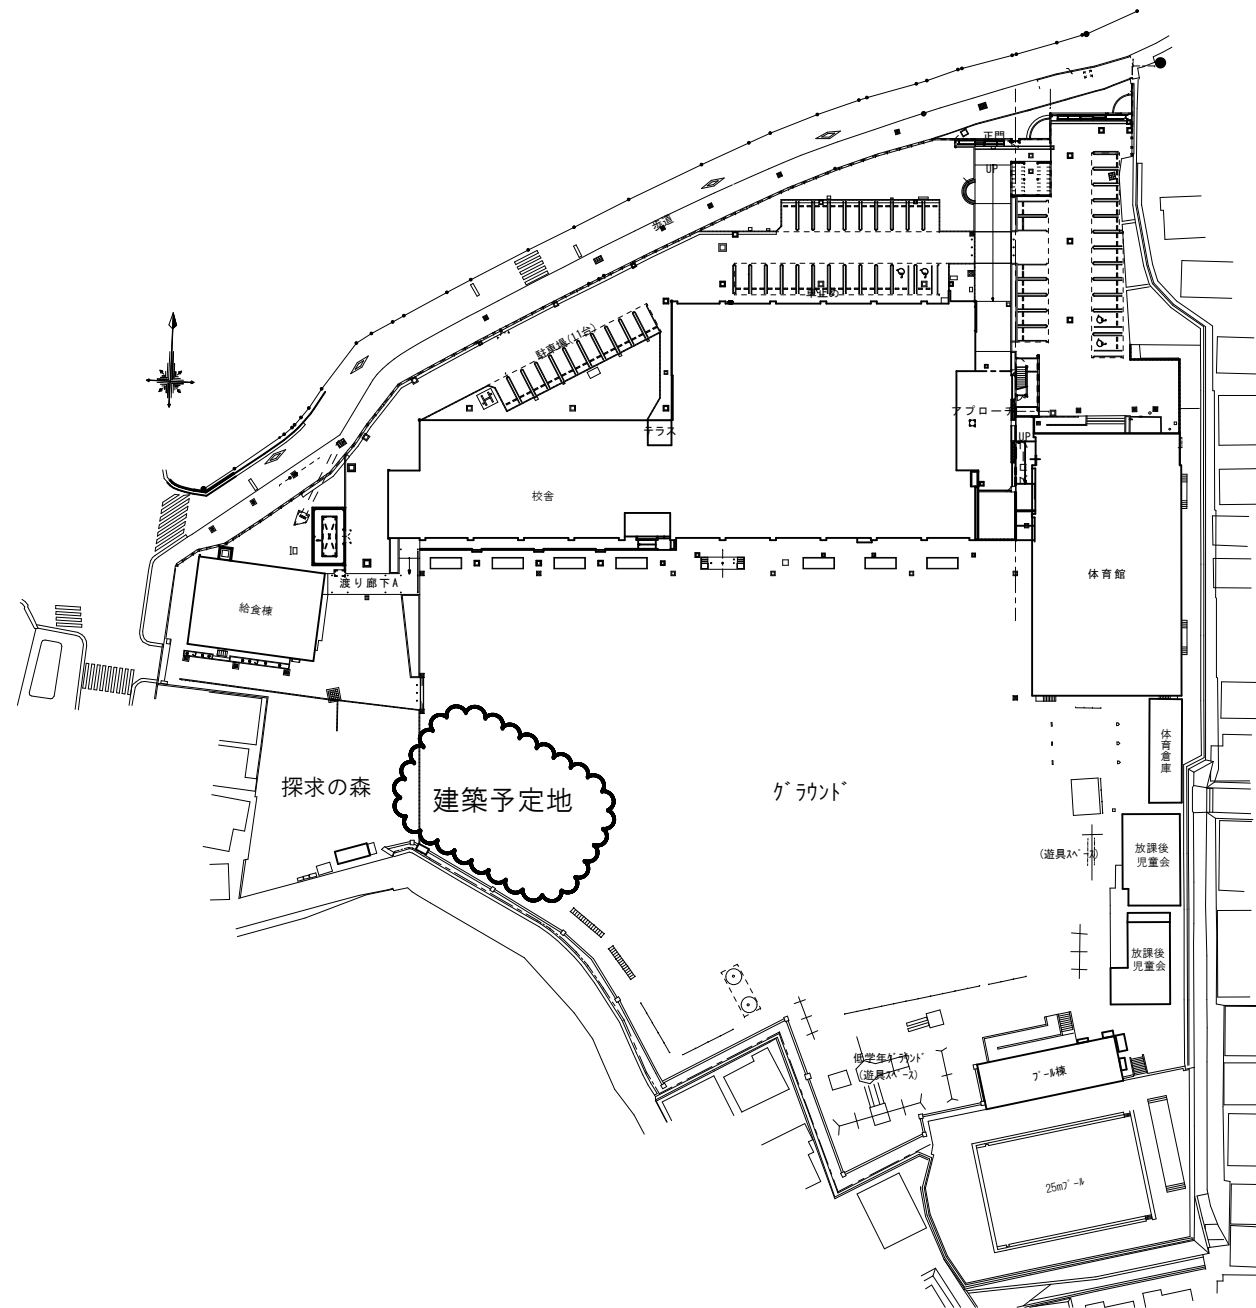

配置図

工程計画

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
地質調査・設計書・発注準備	地質調査・設計書・発注準備											
入札準備期間	入札準備期間											
補助内示	補助内示											
7月入札(仮契約)	7月入札(仮契約)											
8月臨時議会(本契約)	8月臨時議会(本契約)											
設計・申請審査	設計期間：1ヶ月＋申請審査：2ヶ月											
工事	工事											
検査	検査											
